

# Acompanhamento dos Projetos Estratégicos

Semestre 02/2021


Informações coletadas até abril/2022



# Projetos Estratégicos

	Projeto	Área	Entregas	Em dia	Atrasada	Concluída
01	Adequação e modernização de infraestrutura	PRDI	09	0	08	01
02	Consolidação da Expansão - Etapa 1	PRDI	04	0	03	01
03	Institucionalização da EaD	PROEN	05	0	0	05
04	Otimização do Custeio dos Contratos	PROAD	08	0	05	03
05	Plano de Ação da EJA	PROEN	09	06	02	01
06	Política de Comunicação	DCE	05	02	01	02
07	Promoção da formação docente em serviço	PROEN	06	0	03	03
08	Observatório do Mundo do Trabalho	PROEX	05	04	0	01
09	Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	DGP	06	01	04	01
10	Programa de Desenvolvimento de Gestores	DGP	07	06	01	0
11	Desburocratização dos Processos Institucionais	ASSESSORIA EXECUTIVA	05	00	04	01
<b>IFAL</b>			<b>69</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>19</b>

# Projetos Estratégicos

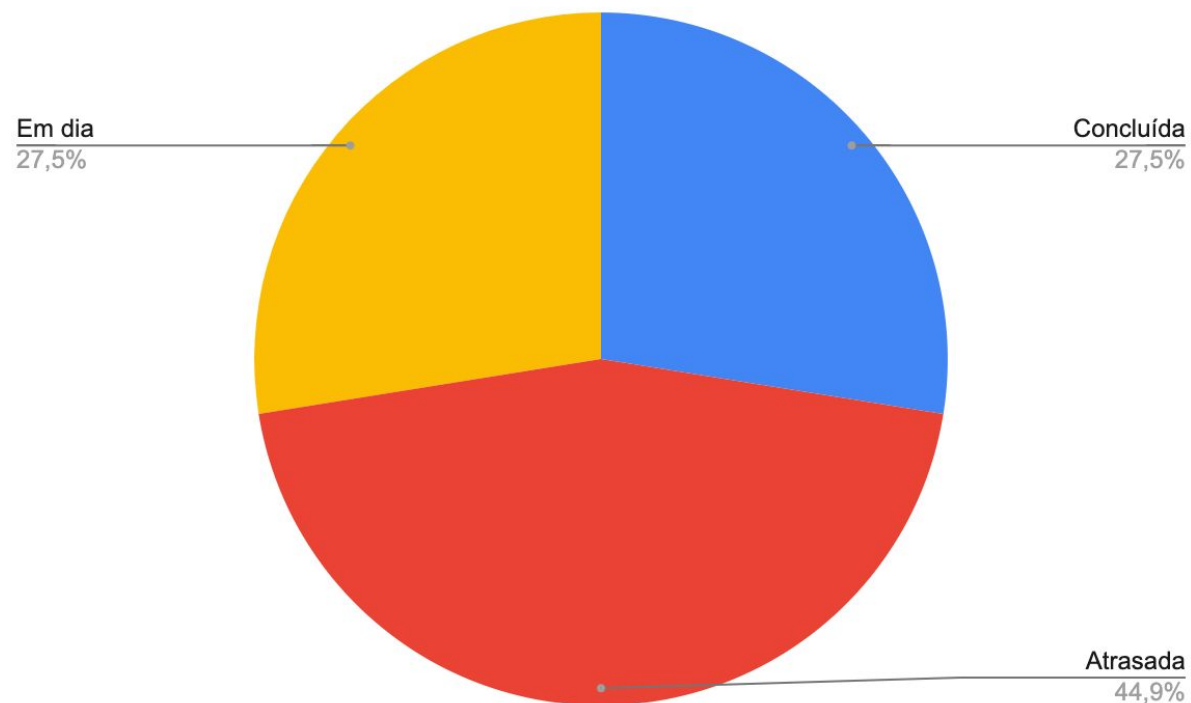

**Entregas CONCLUÍDAS:**

**Meta: 69**

**Resultado: 19**

**Desempenho: 27,5%**

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 01 - Adequação e modernização de infraestrutura

Entrega	Data da entrega	Status
Obra de construção de subestação do Campus Palmeira dos Índios	31/05/2021	Atrasada
Obra de complementação do edifício para engenharia	30/06/2021	Atrasada
Contratação/ Aquisição de appliance de segurança de rede e proteção de dados	30/06/2021	Concluída
Ampliação solução de servidores hiperconvergentes, cloud e backup de dados do Instituto	30/06/2021	Atrasada
Aquisição de ativos de rede, switches e respectivos módulos e acessórios	31/08/2021	Atrasada
Projeto Executivo do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Maceió	30/11/2021	Atrasada
Obra de adequação do sistema de combate a incêndio e pânico e SPDA do Campus Piranhas	31/12/2021	Atrasada
Obra de reforma do refeitório e laboratórios do Campus Penedo	31/12/2021	Atrasada
Contratação de serviço continuado de manutenção corretiva, planejamento, fornecimento e execução de material passivo de rede e cabeamento estruturado	31/12/2021	Atrasada

Repostas dia 12/04/2022

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 02 - Consolidação da Expansão - Etapa 1

Entrega	Data da entrega	Status
Entrega da obra de complementação do Campus São Miguel dos Campos	10/03/2021	Concluída
25% da obra de construção do Campus Rio Largo	31/12/2021	Atrasada
20% da obra de construção do Campus Batalha	31/12/2021	Atrasada
30% Projeto Básico da obra de complementação do Campus Santana do Ipanema (Fase Interna)	31/12/2021	Atrasada

Repostas dia 12/04/2022

Área responsável: PRDI

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 03 - Institucionalização da EaD - 1ª fase\*

Entrega	Data da entrega	Status
Realização de reuniões com gestores, professores e técnicos para planejamento das atividades dos cursos técnicos retomados de Guia de Turismo e em Informática na modalidade a distância	30/06/2021	Concluída
Realização de reunião com alunos dos cursos técnicos subsequentes em Guia de Turismo e em Informática na modalidade a distância	30/06/2021	Concluída
Retomada, com esforços institucionais, das atividades acadêmicas dos cursos técnicos subsequentes em Guia de Turismo e em Informática na modalidade a distância, que foram interrompidos por problemas no processo de pactuação do Programa Bolsa Formação	30/06/2021	Concluída
Formação com professores que atuarão nos cursos retomados	30/12/2021	Concluída
Sensibilização da comunidade acadêmica nos campi do Ifal	30/12/2021	Concluída

\*O Termo de Abertura de Projeto (TAP) teve as entregas atualizadas.

Repostas dia 25/02/2022

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 04 - Otimização do Custeio dos Contratos

Entrega	Data da entrega	Status
Instituir comissão para elaborar o estudo das despesas com contratos continuados	22/02/2021	Concluída
Identificar os contratos continuados (quantos e quais são)	05/03/2021	Concluída
Realizar diagnóstico dos contratos continuados (vigência, unidades participantes, quantidade de postos, valor, etc.)	26/03/2021	Concluída
Realizar diagnóstico das características de cada unidade (localização geográfica, estrutura física, turnos de funcionamento, número de alunos, número de servidores, quantidade de cursos, modalidade de cursos, etc.)	26/03/2021	Atrasada
Investigar “experiências exitosas” de outras instituições (alternativas de contratação, soluções inovadoras, modernas, etc.)	09/04/2021	Atrasada
Estabelecer quais critérios (características) têm influência na definição da demanda de cada contrato	09/04/2021	Atrasada
Definir o padrão contratual para as unidades (com a implementação de novos modelos de contratação)	23/04/2021	Atrasada
Apresentar relatório contendo comparativo da realidade atual com a proposta de implementação do modelo definido	30/04/2021	Atrasada

Repostas dia 22/12/2021

Área responsável: PROAD

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 05 - Plano de Ação da EJA

Entrega	Data da entrega	Status
Assinatura do Termo de Cooperação com os Municípios	18/03/2021	Concluída
Formação Continuada para 120 Professores do Ifal e dos Municípios Parceiros	30/09/2021	Atrasada
Elaboração dos Projetos dos Cursos	30/12/2021	Atrasada
Produção de Material Pedagógico	30/01/2022	Em dia
Ações de Mobilização	25/03/2022	Em dia
Seleção e Matrícula dos Alunos Cursistas	15/04/2022	Em dia
Implantação e Realização dos Cursos FIC	15/12/2022	Em dia
Monitoramento da Permanência Discente	15/12/2022	Em dia
Inovação e Pesquisa + Publicação de um caderno temático ou revista	30/12/2022	Em dia

Repostas dia 25/02/2022

Área responsável: PROEN



# Projetos Estratégicos

## Projeto: 06 - Política de Comunicação\*

Entrega	Data da entrega	Status
Formalização de um núcleo de produção de artes/audiovisual remoto para o departamento	30/06/2020	Concluída
Criação do calendário de eventos institucionais	31/12/2021	Concluída
Elaboração dos manuais de boas práticas para as mídias sociais e canais de comunicação institucional do instituto	30/06/2022	Em dia
Desenvolvimento de ações de comunicação interna (endomarketing) integradas à Política de Qualidade de Vida e no Trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas	31/12/2023	Em dia
Política de Comunicação Institucional do Ifal	31/12/2023	Atrasada

\*O Termo de Abertura de Projeto (TAP) teve as entregas atualizadas.

Repostas dia 21/01/2022

Área responsável: DCE

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 07 - Promoção da formação docente em serviço

Entrega	Data da entrega	Status
Diagnóstico de necessidades de formação em serviço	30/03/2021	Concluída
Chamada pública para docentes formadores	30/04/2021	Concluída
Chamada pública para docentes cursistas	30/06/2021	Atrasada
Realização do 1º momento de formação (200 vagas)	02/08/2021	Concluída
Realização do 2º momento de formação(200 vagas)	15/09/2021	Atrasada
Realização do 3º momento de formação(200 vagas)	03/11/2021	Atrasada

Repostas dia 25/02/2022

Área responsável: PROEN

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 08 - Observatório do Mundo do Trabalho\*

Entrega	Data da entrega	Status
Banco de empresas conveniadas	31/12/2020	Concluída
Banco de currículos de alunos do Ifal	30/12/2021	Em dia
Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (PAE)	30/12/2021	Em dia
Feira de Oportunidades	30/06/2022	Em dia
Pesquisa de mercado visando a integração escola-empresa	30/12/2022	Em dia

\*O Termo de Abertura de Projeto (TAP) teve as entregas atualizadas.

Repostas dia 29/09/2021

Área responsável: PROEX

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 09 - Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho

Entrega	Data da entrega	Status
Formação na área de Qualidade de Vida no Trabalho para servidoras/es de Gestão de Pessoas do Ifal	30/06/2021	Concluída
Pesquisa de avaliação do clima organizacional e mensuração dos resultados obtidos com as ações de promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho	15/08/2021	Atrasada
Documento/Política de Desenvolvimento de Pessoas	15/10/2021	Atrasada
Documento/Política de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho	15/10/2021	Atrasada
Implantação do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional no Ifal, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto das/os trabalhadoras/es.	20/12/2021	Atrasada
Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR no Ifal, visando à preservação da saúde e da integridade das/os trabalhadoras/es.	23/03/2022	Em dia

Repostas dia 10/01/2022

Área responsável: DGP

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 10 - Programa de Desenvolvimento de Gestores

Entrega	Data da entrega	Status
Definição do perfil de competências por função/cargo	20/11/2021	Atrasada
Definir os conteúdos de cada módulo de formação	30/06/2022	Em dia
Qualificação do Processo de Avaliação de Desempenho das/os servidoras/es	30/06/2022	Em dia
Elaboração do Manual do Gestor	15/08/2022	Em dia
Procedimentos para a formação de sucessores para ocupação de funções de gestão	30/08/2022	Em dia
Estabelecimento de procedimentos de reconhecimento, a partir de regras claras e transparentes	15/11/2022	Em dia
Programa de desenvolvimento de gestores estruturado	15/11/2022	Em dia

Repostas dia 10/01/2022

Área responsável: DGP

# Projetos Estratégicos

## Projeto: 11 - Desburocratização dos Processos Institucionais

Entrega	Data da entrega	Status
Relatório contendo os normativos vigentes.	26/02/2020	Concluída
Portarias Normativas atualizadas e publicadas.	01/06/2021	Atrasada
Fluxos de processos, relacionados às portarias normativas, atualizados e publicados.	31/07/2021	Atrasada
Resoluções e IN atualizadas e publicadas	01/12/2021	Atrasada
Fluxos dos processos relacionados as resoluções e Instruções Normativas, atualizados e publicados.	31/03/2022	Atrasada

Repostas dia 18/04/2022

Área responsável: ASSESSORIA EXECUTIVA

# Projetos Estratégicos

## Cancelados:

- Implementação da oferta regular de Cursos de Formação Inicial e Continuada (Responsável: PRPPI)
- Plano de Qualificação Institucional (Responsável: Proex)

- + Instituto Federal de Alagoas
- + Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional
- + Diretoria de Planejamento Institucional
- + [dpi@ifal.edu.br](mailto:dpi@ifal.edu.br)

